

Sanierung des Rheingau-Bades - Information der Nutzer


Baulicher Zustand

- abgeplatzte Fliesen
 - Wassereintritt ins UG
 - Durchnässter Estrich im EG
- > Bauwerksschädigung



Sanierungsplanung


- Edelstahlvollausskleidung
- Fliesenbeläge
- Beleuchtung
- Startblöcke
- ect.



Projektfinanzierung

Gesamt Investitionskosten 2.751.000

- Förderung „SWIM“ durch Land Hessen 1.000.000
- Förderung Sanierung Einrichtungen Sport, Jugend und Kultur durch Bund 1.000.000
- Anteil Geisenheim 751.000

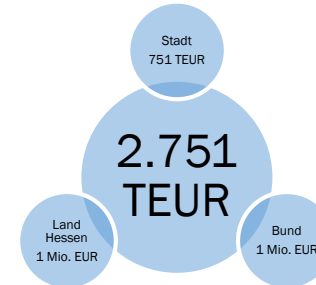

Name	Dauer	Start	Ende
1 Gutachterliche Stellungnahmen	3 Tage	22.01.20 08:00	24.01.20 17:00
2 Aufhebung Sparvermerk Stadtverordneten	1 Tag	06.02.20 08:00	06.02.20 17:00
3 Information der Nutzer	1 Tag	10.02.20 08:00	10.02.20 17:00
4 Lebensverpflichtung LPH 3	48 Tage	27.01.20 08:00	01.04.20 17:00
5 Planung/Leistung Bauwerkstechnik	47 Tage	27.01.20 08:00	31.03.20 17:00
6 Übergabe der Unterlagen an STW	1 Tag	31.03.20 07:00	31.03.20 17:00
7 Zusammenstellung des "Volumen 2" an IFO	1 Tag	01.04.20 07:00	01.04.20 17:00
8 Prüfung des "Volumen 2" durch IFO	30 Tage	01.04.20 07:00	12.05.20 17:00
9 Ausführungplanung LPH 5 + 6	63 Tage	01.04.20 08:00	26.06.20 17:00
10 Planunterlagen Bauwerkstechnik	43 Tage	01.04.20 08:00	20.05.20 17:00
11 Erstellung Leistungsbeschreibung	23 Tage	02.04.20 08:00	26.06.20 17:00
12 Vergabe LPH 7 - Bauabgrenzung	63 Tage	29.06.20 08:00	21.09.20 17:00
13 Veröffentlichung / Versand LV	1 Tag	29.06.20 08:00	29.06.20 17:00
14 Angebotsfrist	23 Tage	29.06.20 08:00	29.07.20 17:00
15 Submission	1 Tag	29.07.20 08:00	29.07.20 17:00
16 Anweisung / Vergabenergebnis	14 Tage	29.07.20 08:00	17.08.20 17:00
17 Beauftragung Bauleitung	1 Tag	31.08.20 08:00	31.08.20 17:00
18 Bauüberwachung	33 Tage	01.09.20 08:00	21.09.20 17:00
19 Beauftragung des Bauers	247 Tage	18.09.20 08:00	18.08.21 17:00
20 Erstellung Baubetrieb	1 Tag	18.09.20 08:00	18.09.20 17:00
21 Abschlussparty	1 Tag	19.09.20 08:00	21.09.20 17:00
22 Objektübernahme LPH 8	246 Tage	21.09.20 08:00	18.08.21 17:00
23 Besuch (10 Monate)	220 Tage	21.09.20 08:00	23.07.21 17:00
24 Inbetriebnahme	26 Tage	26.07.21 08:00	30.08.21 17:00
25 Erstellung Schlussrechnung	30 Tage	23.07.21 08:00	30.09.21 17:00
26 Prüfung Schlussrechnung	30 Tage	30.09.21 07:00	30.11.21 17:00
27 Aufstellung Vermögensaufwands	30 Tage	30.11.21 08:00	31.12.21 17:00
28 Prüfung Vermögensaufwands	30 Tage	03.01.22 08:00	30.02.22 17:00
29 Abschluss Vorkosten	1 Tag	14.03.22 08:00	14.03.22 17:00
30 Interne Arbeiten STW	236 Tage	05.10.20 07:00	30.08.21 17:00

Letzter Badetag : 18. September 2020

Erster Badetag : 30. August 2021
